N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Consegna dei lavori	12/01/2014	13/01/2014	1
2	Preparazione cantiere	13/01/2014	17/01/2014	4
3	Predisposizione piano di posa e platea fontanello	17/01/2014	21/01/2014	4
4	Installazione fontanello	21/01/2014	25/01/2014	4
5	Sistemazione marciapiede	25/01/2014	27/01/2014	2
6	Rimozione paline portasegnali e spostamento palo illuminazione	27/01/2014	29/01/2014	2
7	Realizzazione pavimentazione architettonica	29/01/2014	05/02/2014	7
8	Installazione elementi di arredo urbano: panchine, dissuasori, binocolo, ringhiere	05/02/2014	11/02/2014	6
9	Pulizia muro di contenimento	11/02/2014	15/02/2014	4
10	Sistemazione aiuola	15/02/2014	17/02/2014	2
11	Impianto di illuminazione aiuola	17/02/2014	25/02/2014	8
12	Pavimentazione Via Petrarca	25/02/2014	05/03/2014	8
13	Sistemazione area verde	05/03/2014	09/03/2014	4
14	Pulizie e smobilizzo	09/03/2014	12/03/2014	3
15	Fine lavori	12/03/2014	13/03/2014	1

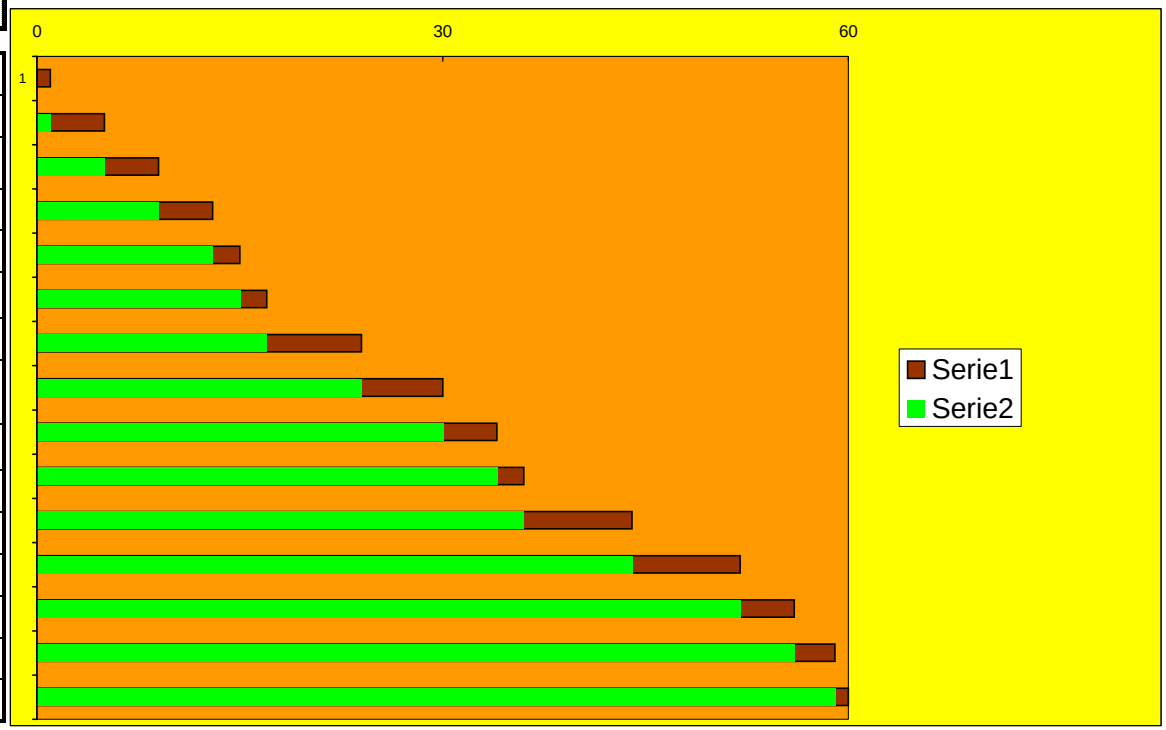

Inizio dei lavori

0 gg

gg

Fine lavori

60

TC **60** gg.

naturali consecutivi
